

INMO
desarrollos

INFINITY
apartments & lofts



AVANCES DE OBRA

MARZO 2021

ESTRUCTURA DE HORMIGON

Etapas recientes y sus porcentajes de avance:

- Hormigonado del piso 9 de planta tipo (12/02/21): 100%
- Hormigonado de escalera al piso 9: 100%
- Armado de pilares para la losa de azotea: 100%
- Previsión de hormigonado última losa: se aguarda detalles finales del calculista
- Hormigonado de pilares para losa azotea: 100%
- Excavación para el tanque de agua inferior: 50%



Nivel de losa para el piso 9 con el trabajo de armaduras



Encofrado y armado de la ultima losa de plano tipo



Hormigonado del piso 9 de plantas tipo



Sectores ya terminados



Avance en el hormigonado de la ultima losa de departamentos



Losa del nivel 9 ya hormigonada



Avance en los pilares para la ultima losa o azotea



Pilares para la losa de azotea



Inicio de la excavación para el tanque enterrado de agua en planta baja



Avance de la excavación para el tanque



Vista actual del avance de los trabajos de excavación para el tanque enterrado

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS

Primer piso de Dptos.:

- Cerramientos de mampostería: 100%
- Contrapiso y carpeta: 100%
- Instalación hidráulica (cocinas y baños): 100%
- Instalación de PCI (tendido de cañería galvanizadas): 100%
- Colgantes cloacales de baños: 0%
- Cableado eléctrico: 100%
- Colocación de piso: 20%
- Aislación de losas baños y balcones: 50%
- Revoque de paredes interiores: 100%
- Instalación eléctrica (ductos, cajas): 100%
- Instalación de AA (ducteado y desagüe): 100%
- Parrilla (mampostería y losa piso base): 80%
- Enduido de paredes: 89%
- Cielorraso: 20%
- Colocación de pre marcos: 50%

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS

Segundo piso de Dptos.:

- Cerramientos de mampostería: 100%
- Contrapiso y carpeta: 100%
- Instalación hidráulica (cocinas y baños): 100%
- Instalación de PCI (tendido de cañería galvanizadas): 100%
- Colgantes cloacales de baños: 80%
- Cableado eléctrico: 0%
- Colocación de piso: 0%
- Revoque de paredes interiores: 100%
- Instalación eléctrica (ductos, cajas): 100%
- Instalación de AA (ducteado y desagüe): 100%
- Parrilla (mampostería y losa piso base): 85%
- Enduido de paredes: 80%
- Cielorraso: 0%
- Colocación de pre marcos: 15%

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS

Tercer piso de Dptos.:

- Cerramientos de mampostería: 100%
- Contrapiso y carpeta: 100%
- Instalación hidráulica (cocinas y baños): 85%
- Instalación de PCI (tendido de cañería galvanizadas): 50%
- Colgantes cloacales de baños: 40%
- Cableado eléctrico: 0%
- Colocación de piso: 0%
- Revoque de paredes interiores: 100%
- Instalación eléctrica (ductos, cajas): 100%
- Instalación de AA (ducteado y desagüe): 100%
- Parrilla (mampostería y losa piso base): 20%
- Enduido de paredes: 0%
- Cielorraso: 0%
- Colocación de pre marcos: 0%

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS

Cuarto piso de Dptos.:

- Cerramientos de mampostería: 100%
- Revoque de paredes interiores: 50%
- Contrapiso y carpeta: 0%
- Instalación eléctrica (ductos, cajas): 0%
- Instalación hidráulica (cocinas y baños): 0%
- Instalación de AA (ducteado y desagüe): 30%
- Instalación de PCI (tendido de cañería galvanizadas): 0%
- Parrilla (mampostería y losa piso base): 0%
- Colgantes cloacales de baños: 0%

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS

Quinto piso de Dptos.:

- Cerramientos de mampostería: 20%
- Revoque de paredes interiores: 15%
- Contrapiso y carpeta: 0%
- Instalación eléctrica (ductos, cajas): 0%
- Instalación hidráulica (cocinas y baños): 0%
- Instalación de AA (ducteado y desagüe): 0%
- Instalación de PCI (tendido de cañería galvanizadas): 0%
- Parrilla (mampostería y losa piso base): 0%
- Colgantes cloacales de baños: 0%

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS RUBROS POR PLANTA DE DEPARTAMENTOS

Sexto piso de Dptos.:

- Cerramientos de mampostería: 20%
- Revoque de paredes interiores: 0%
- Contrapiso y carpeta: 0%

Seguidamente, algunas tomas fotográficas del trabajo en estos rubros citados:



Soportes metálicos para los colgantes bajo losa



Colocación de pre marcos en el 2A



Contrapiso y carpeta en el 3B



Aislación sectores de balcón piso 1



1A

Inicio de la colocación de piso en el 1A



1E

Colocación del piso porcelanato en el 1E



1D

Proceso de aislación losa baño en el 1D



Pintura hidrófuga para aislación en balcón del 1B



1B

Inicio del cielorraso en el 1B



1E

Cielorraso y enduido una mano en el 1E



Cielorraso en el primer piso




1C

Pre marco de ventana a ser colocado en el 1C



2C

Colocación de pre marco en el 2C

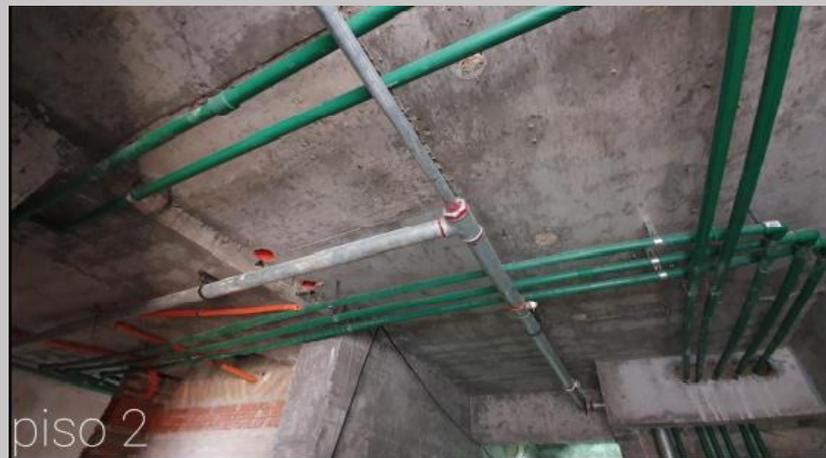

piso 2

Instalación de PCI e hidráulica en losa techo del piso 2



3D

Instalación de agua en baño del 3D



Inicio losa de parrilla en el 3C



Revoque e instalaciones bajo losa del 3C



Ducteado de AA en el 4C



Mampostería e inicios del revoque en el 4E



Inicios de la mampostería linderas de cerramiento en el piso 5



Cerramiento lindero en el piso 6



Pintura cementicia en losa techo de E2



Pintura cementicia en losa techo de E1



Vista del estacionamiento E2 y los trabajos de pintura



Equipo montacarga y personal ya en pleno funcionamiento



Montacarga



Vista actual del avance



Vista desde una de las fachadas laterales



Otra vista del avance actual



Vista actual de la fachada principal sobre Stma. Trinidad



+595 981 508 330
ventas@inmo.com.py
www.inmo.com.py
