

INMO
desarrollos

MARQUIS
VILLA MORRA



AVANCES DE OBRA

JUNIO 2021

ESTRUCTURA DE HORMIGON

Etapas recientes y sus porcentajes de avance:

- Pilares para el piso 13: 100%
- Encofrado y armado losa del piso 13: 98%
- Escalera hasta piso 12: 100%
- Previsión de hormigonado losa piso 13: 04/06
- Pisos restantes a ser hormigonados: 13 y losa de azotea
- Previsión de finalización de la estructura (tanque sup-tapa escalera y ascensores): finales mes de junio

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos en la estructura:



Hormigonado de la caja de escalera y ascensores hasta piso 13



Encofrado y hormigonado de los pilares hasta nivel del piso 13



Encofrado, armaduras e instalaciones para la losa del nivel de piso 13



Avance del encofrado piso 13




Hormigonado de la caja de escalera y ascensores hasta piso 13

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Primer piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Segundo piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Tercer piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Cuarto piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Quinto piso de Dpto.

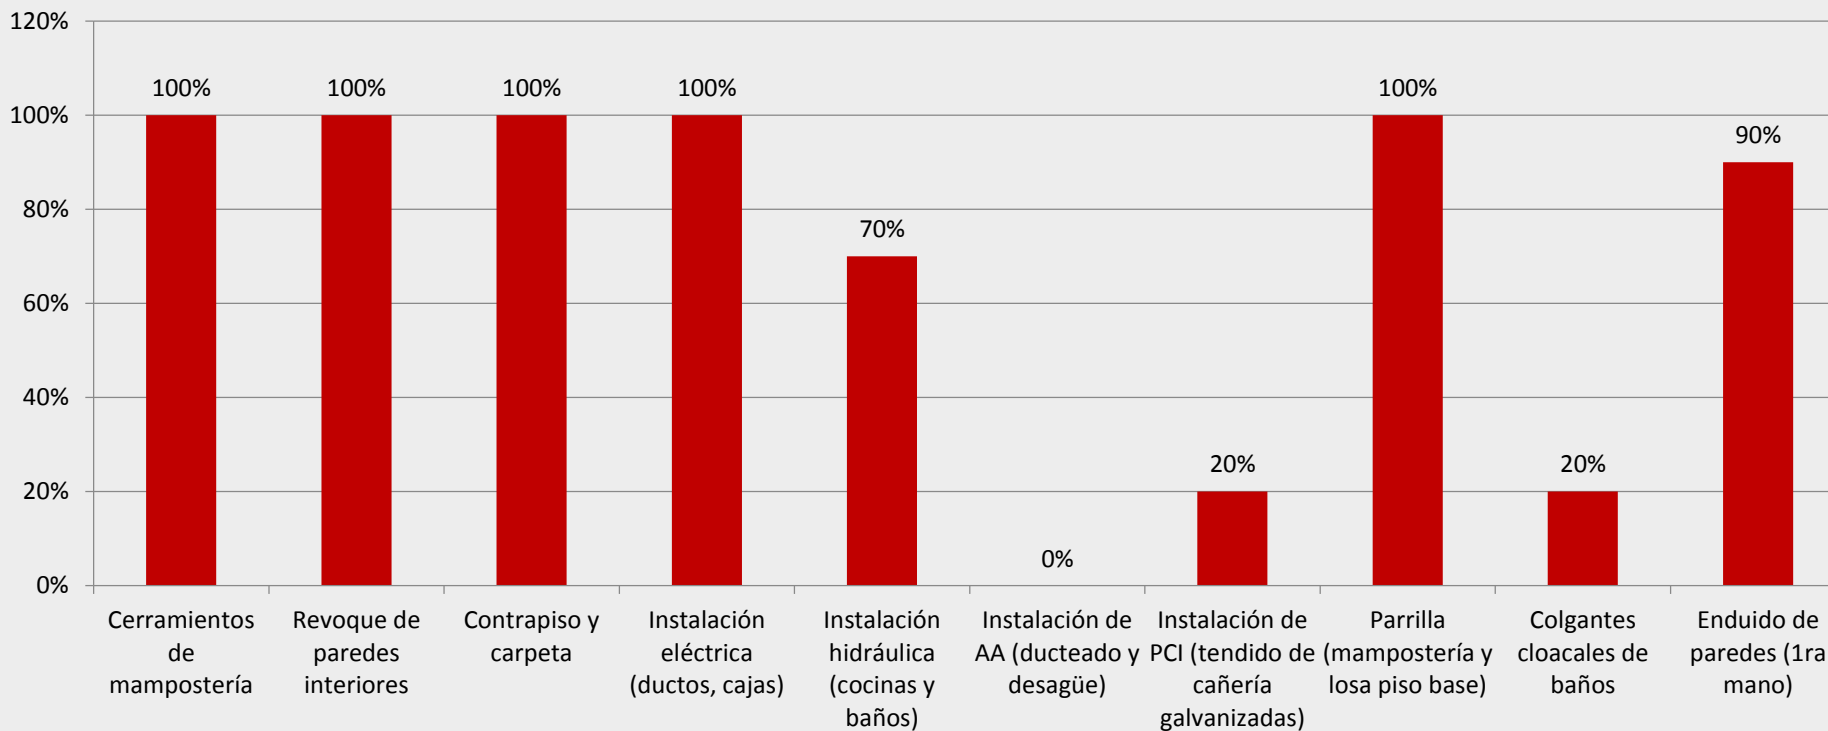

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Sexto piso de Dpto.

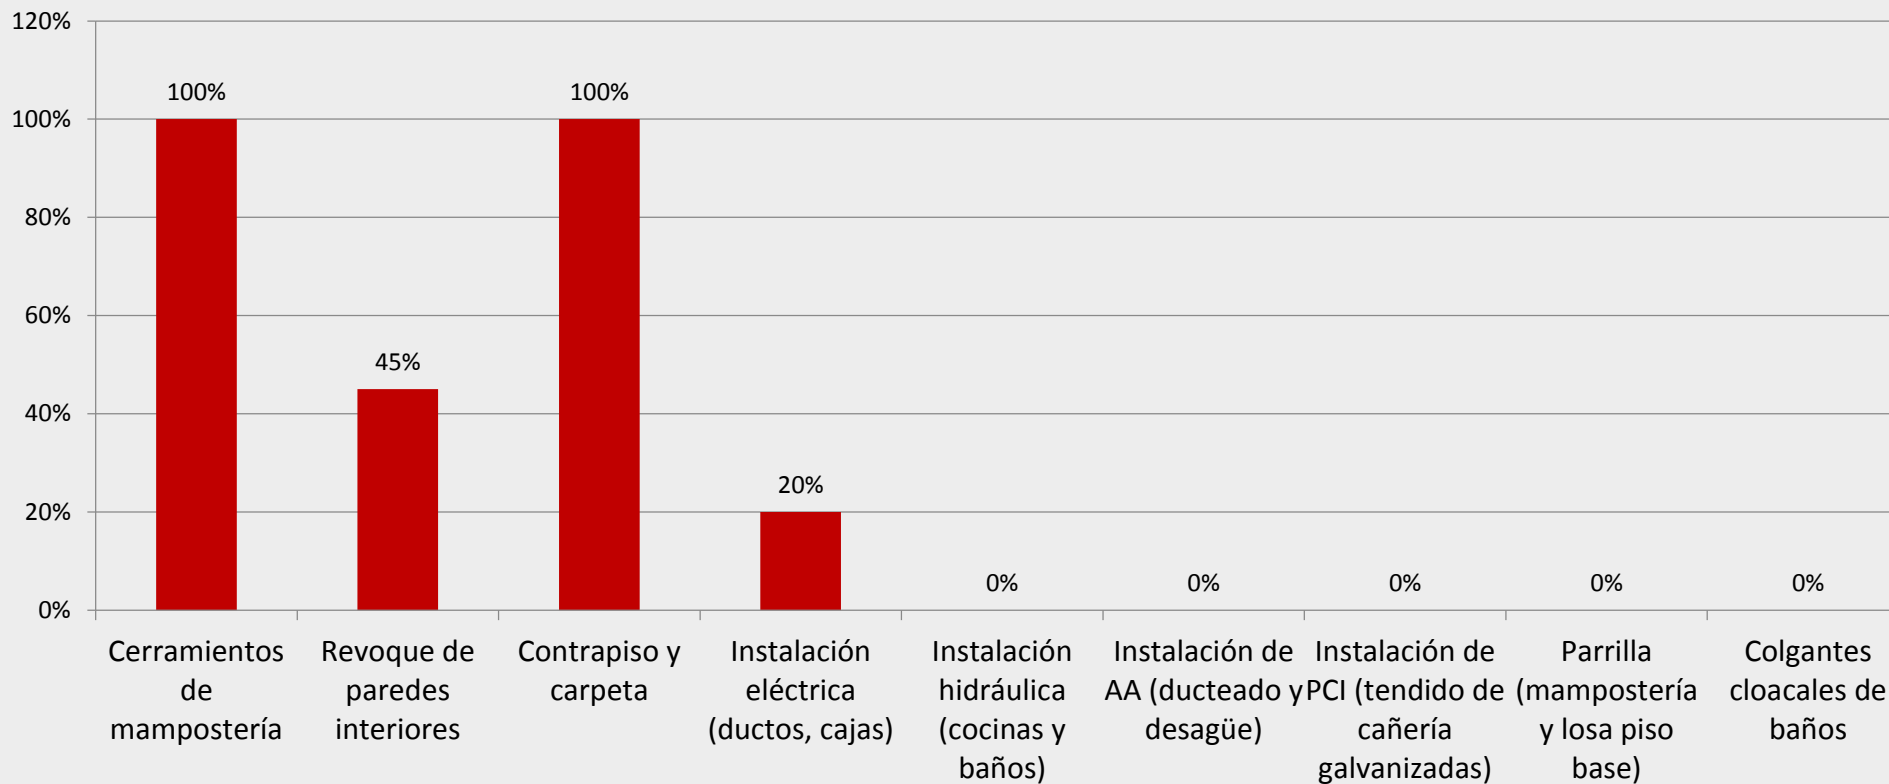

NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Séptimo piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:


Octavo piso de Dpto.



NIVELES DE DEPARTAMENTOS:

AVANCE ACTUAL DE LOS PRINCIPALES RUBROS POR PISO:

Noveno piso de Dpto.

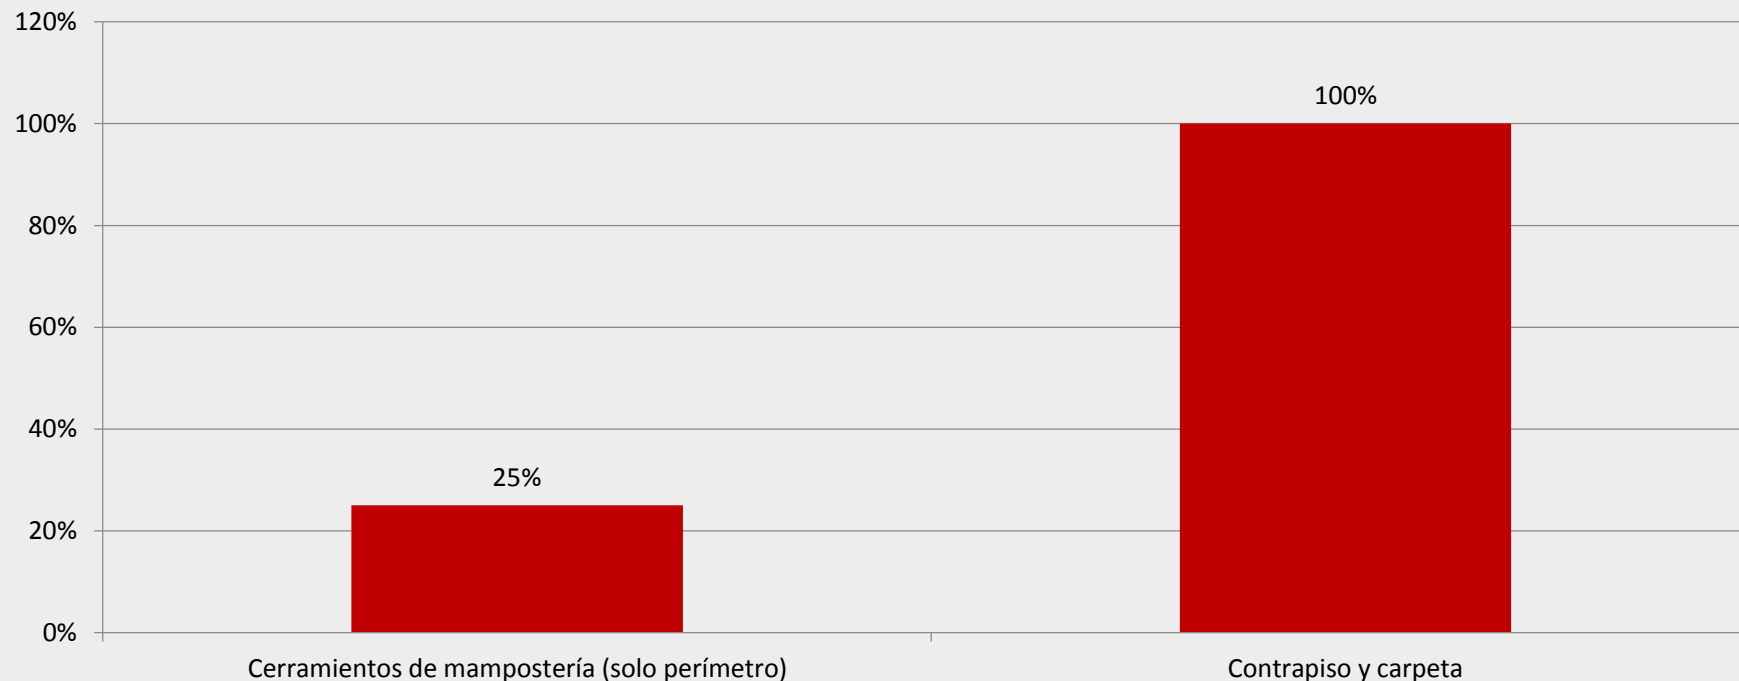




Montaje de barandas en el piso 1



Montaje de muebles de cocina en el 1B



Colocacion de puertas 1B



Puerta de acceso y muebles de cocina en el 1F



Montaje de parrilla en el primer piso



Artefactos de iluminación y sensor H/C piso 1



Montaje de placar y aberturas en el 1F



Artefacto y revestido en baño del 1C



Terminaciones en baño del 1E



Detalles de la mezcladora y nicho en el baño del 1A



Puerta acceso a baulera en palier del piso 1



Detalle de la abertura acceso a sector técnico de compresores piso 1



Montaje muebles de cocina, mesada y bacha en el 1F



Montaje de placares en el 1C



Una vista actual del 2C




Desagües en baño del 2E




Enduido una mano y cielorraso en el 3B



Avances en el 3C

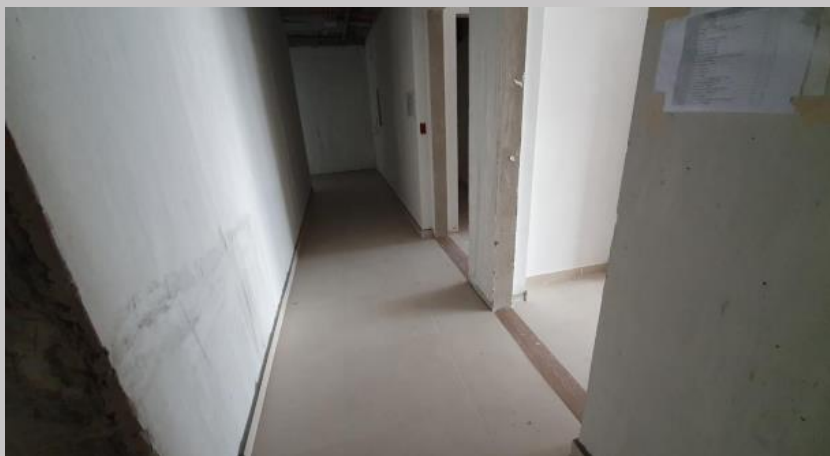

Avances en palier del piso 3



Colocación de piso 4A



Colocación PCI piso 4



Agua y desagües en baños del piso 5



Enduido una mano e instalaciones en el 5C



Vista actual palier piso 6



Carpeta piso y revoque de paredes en el 6C



Mampostería en el 7E



Mampostería en el 7D




Avance de las paredes en el piso 8 de departamentos



Cerramientos en linderos del piso 9

AVANCES EN OTROS SECTORES:

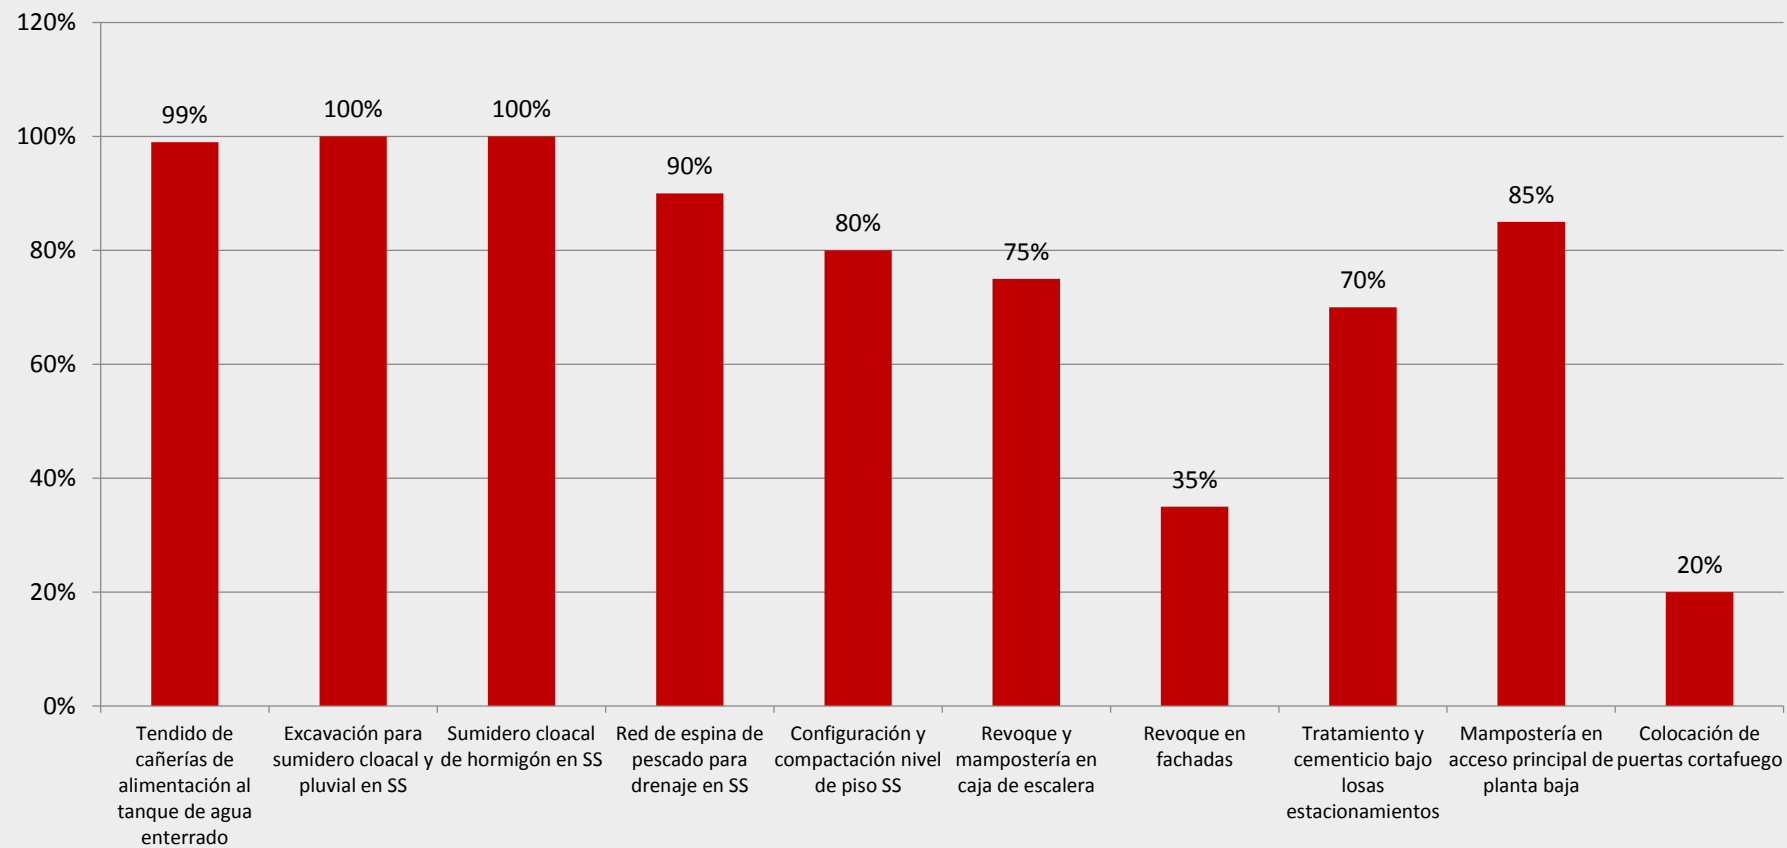

A continuación, algunas tomas fotográficas:



Mampostería pilarizada y envarillada en acceso planta baja



Cerramiento en acceso planta baja



Mampostería acceso planta baja



Trabajos de puesta a tierra sub suelo



Tanque sumidero cloacal en el sub suelo



Prolijado y pintado de la caja de ascensores



Colocación de puertas cortafuego



Una vista del avance en el revoque y mochetas de fachadas



Vista actual desde otra perspectiva



Una vista desde esquina de calle Pacheco y Torreani Viera

Desarrola y Comercializa:

INMO
desarrollos
