

INMO
desarrollos

LAGUNA CLUB
apartments & lofts



LAGUNA CLUB

apartments & lofts

AVANCES DE OBRA

ENERO 2022

ESTRUCTURA DE HORMIGON

- Losa primer piso de departamentos: 100%
- Hormigonado losa segundo piso (22-07-21): 100%
- Pilares losa tercer piso: 100%
- Encofrado losa tercer piso: 100%
- Instalaciones en losa (electroductos, cajas y sanitaria): 100%
- Armaduras losa piso 3 y pasantes sanitarios: 100%
- Hormigonado losa tercer piso (20-09-21): 100%
- Encofrado y carga de pilares para piso 4: 100%
- Hormigonado losa piso 4 de departamentos (25-10-21): 100%
- Hormigonado de pilares para piso 5: 100%
- Hormigonado losa piso 5 de departamentos (27-11-21): 100%
- Hormigonado losa piso de azotea (29-01-22): 100%
- Armadura y encofrado pilares losa quincho, caja escalera y piscina: 30%
- Tanque de agua inferior: 100%



A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos:



Armadura y encofrado losa piso azotea ya lista para ser hormigonada



Armadura de la piscinas en la azotea



Zona de refuerzos de punzamiento



Encofrado y armado losa azotea y arranque de piscinas



Vista del nivel de losa azotea antes de ser hormigonada



Hormigonado losa piso de azotea



Hormigonado del nivel de azotea



Una vista del avance en el hormigonado



Losa piso azotea ya hormigonada




Tabiques y losa fondo del tanque de agua inferior




Tapa de tanque ya terminada

PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:


PLANTA BAJA

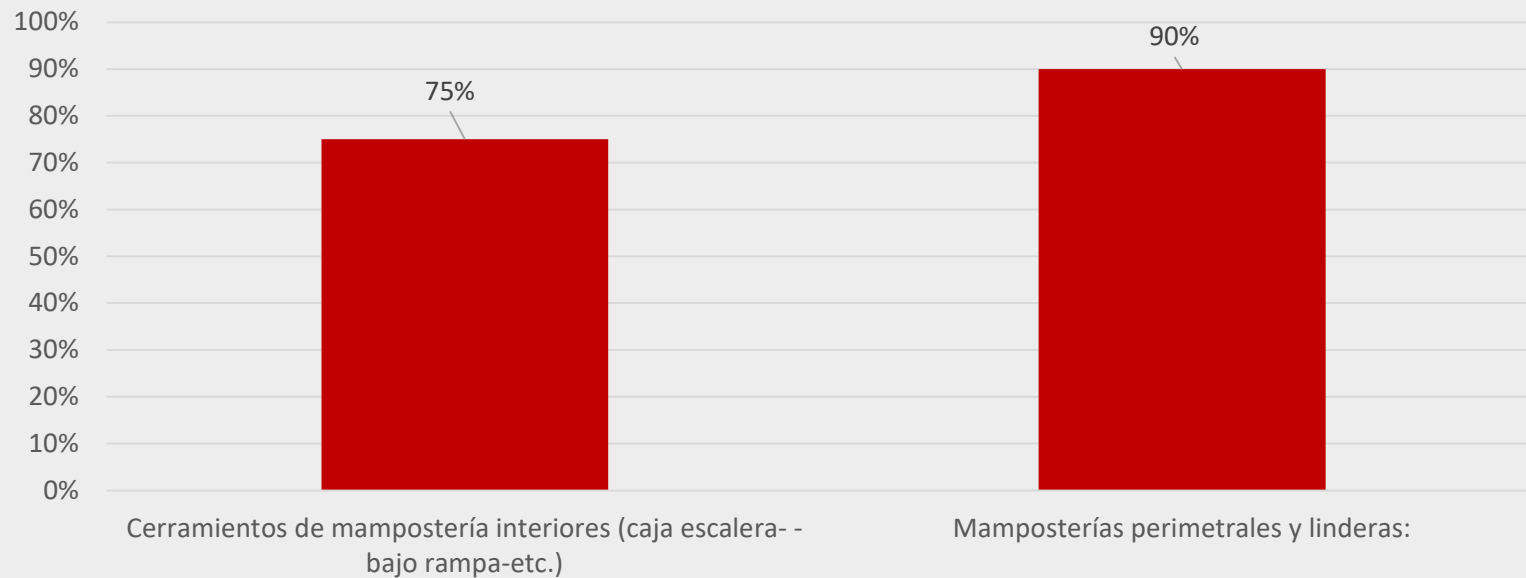


PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:

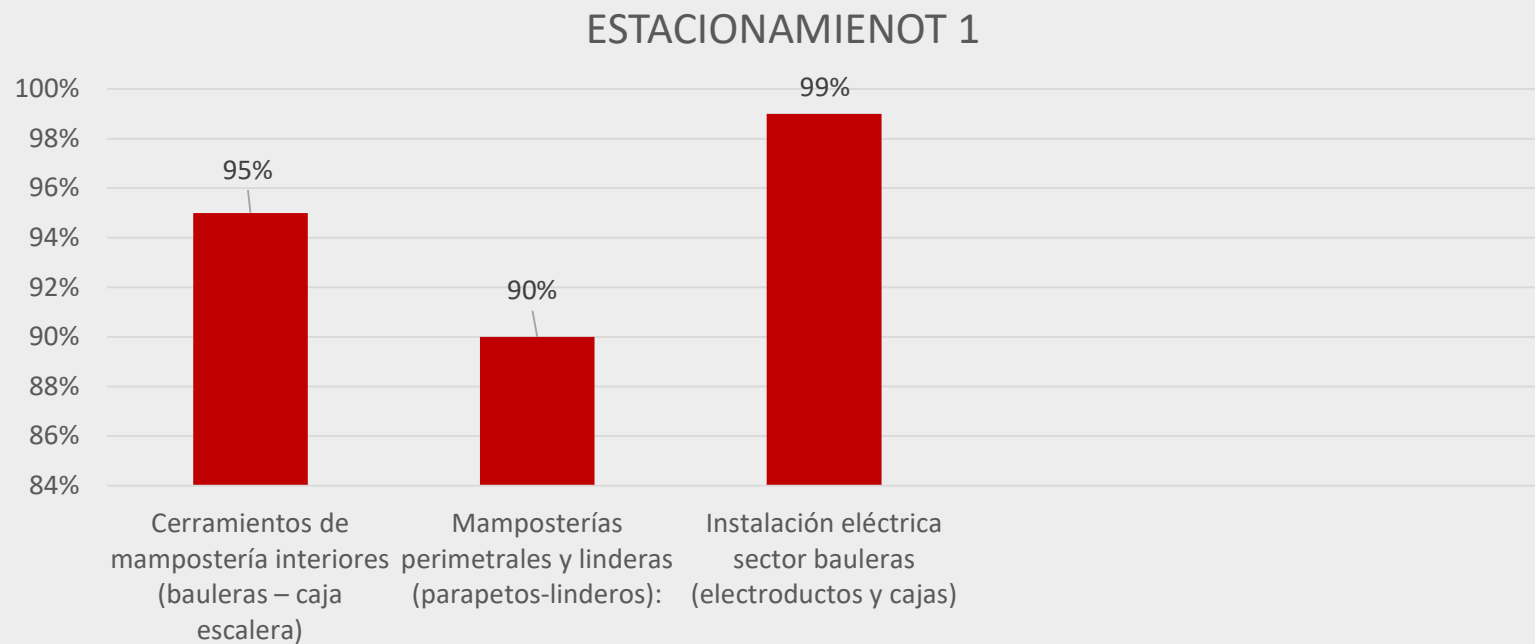

PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:

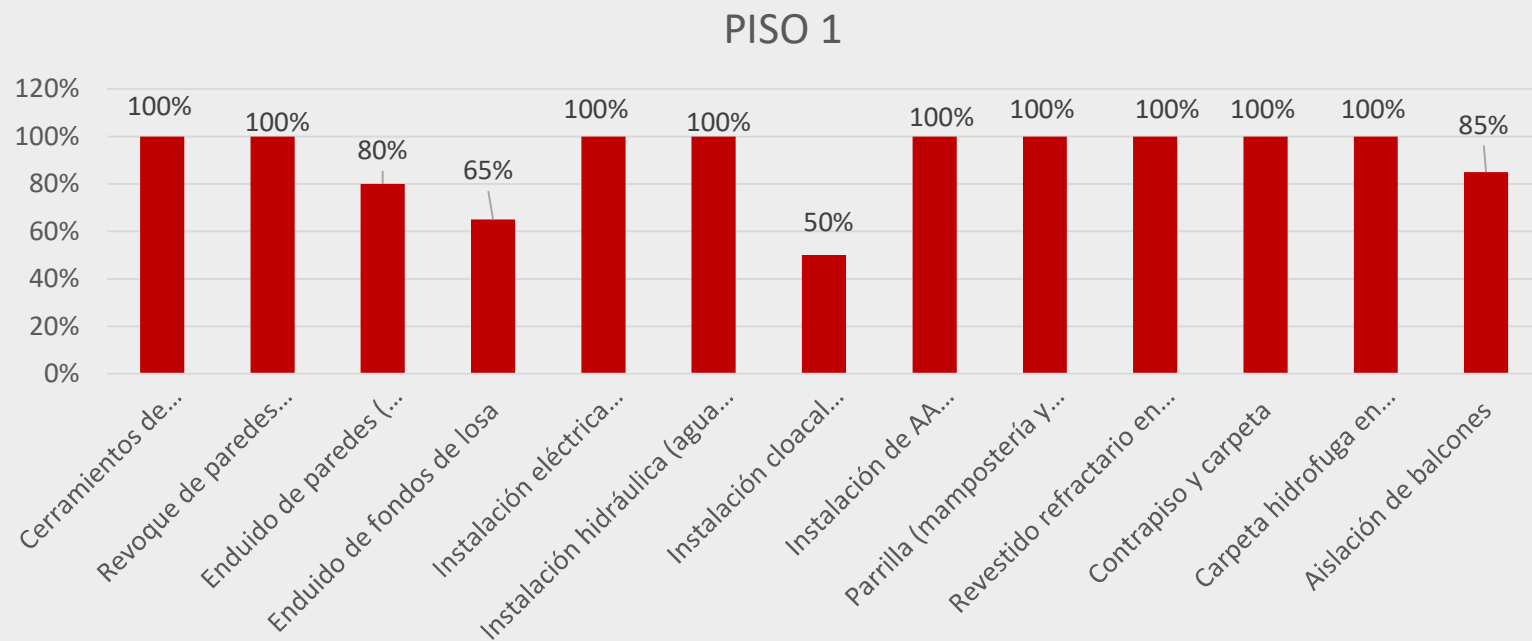


PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:

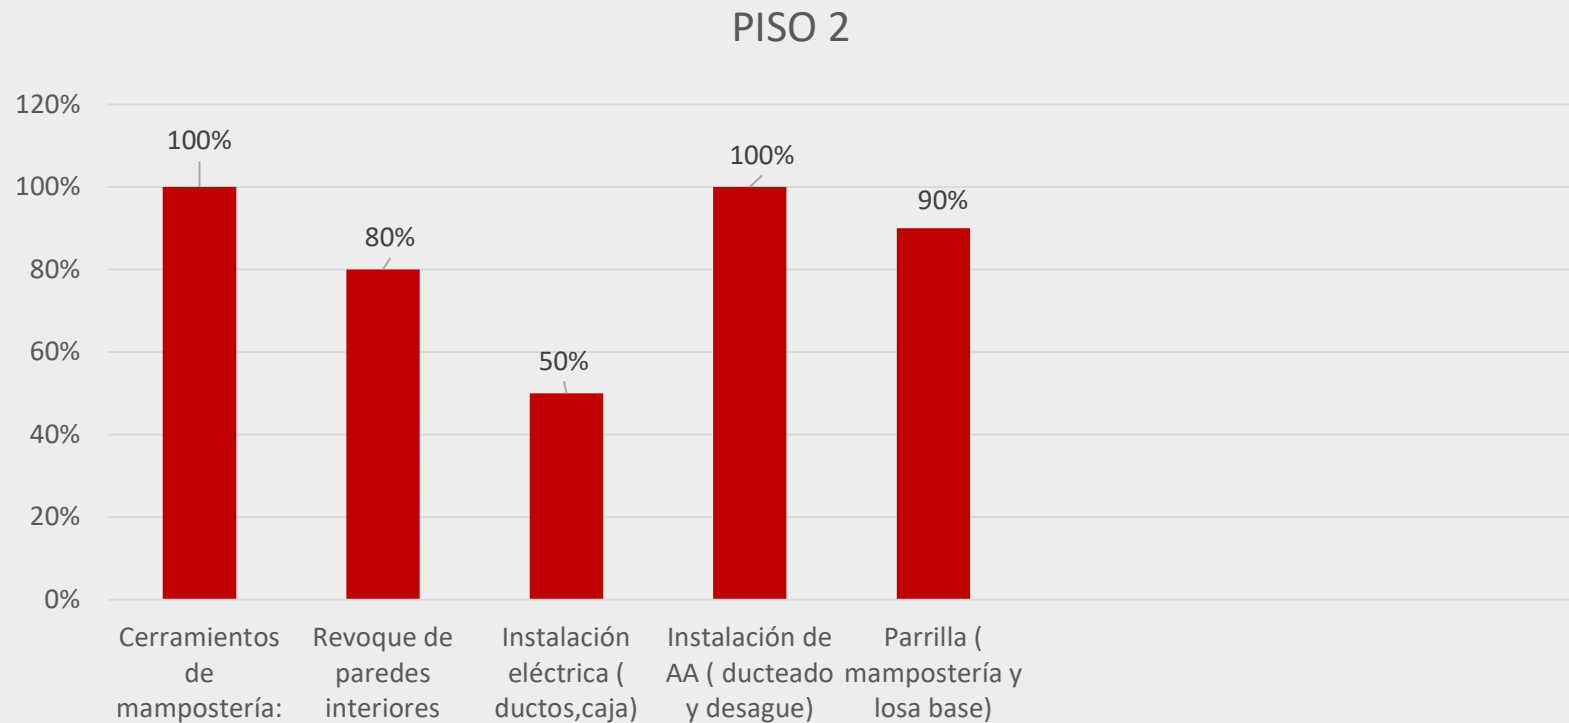

A continuación, algunas tomas fotográficas de los trabajos en este rubro:

PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:

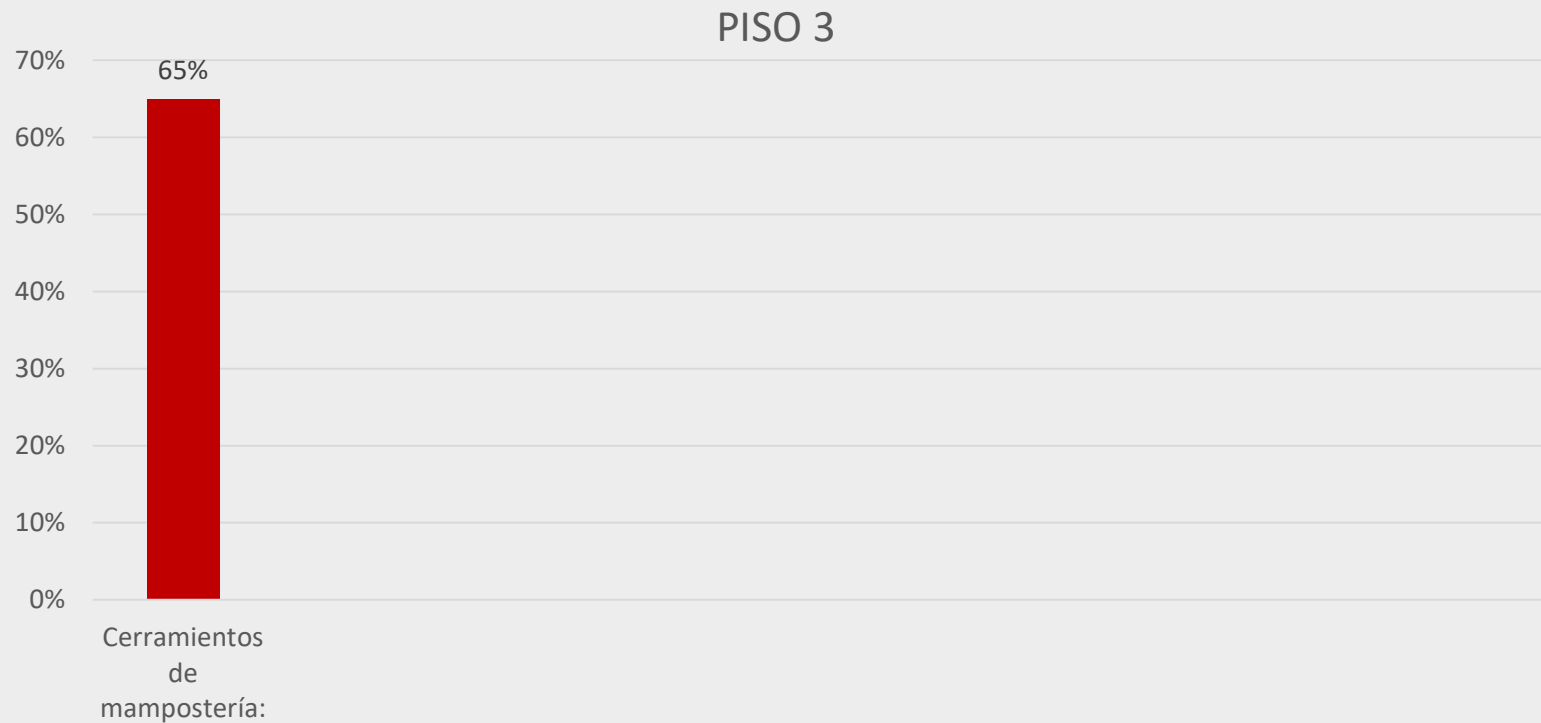

A continuación, algunas tomas fotográficas de los trabajos en este rubro:

PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:





Enduido de paredes una mano piso 1



Vista actual 1C



Ducteado y desague AA piso 1



Instalación de agua y desagües baños piso 1



Instalaciones bajo losa techo piso 1



Enduido de paredes y fondos de losa primer piso



Revestido refractario en parrillas piso 1



Aislación de losas de balcones piso 1



Una vista actual de la zona del palier piso 2



Avance del revoque interior en piso 2



Ducteado para AA y sus desagües en piso 2



Vista actual del avance en el revoque dptos. Del piso 2



Replanteo para inicio de la instalación de agua en baños del piso 2



Vista del avance en las parrillas del segundo piso



Avance de los cerramientos de mampostería piso 3



Parapeto perimetral piso 4



Una vista actual del nivel 4



Vista actual de el avance



Vista actual desde otra perspectiva



Vista actual de la fachada posterior



Fachada principal

Desarrola y Comercializa:



 +595 981 442 600 / +595 986 600 850

 ventas@inmo.com.py

 www.inmo.com.py

  @inmodesarrollos
