

INMO
desarrollos

LAGUNA CLUB
apartments & lofts



LAGUNA CLUB

apartments & lofts

AVANCES DE OBRA

NOVIEMBRE 2021

ESTRUCTURA DE HORMIGON

- Losa primer piso de departamentos: 100%
- Hormigonado losa segundo piso (22-07-21): 100%
- Pilares losa tercer piso: 100%
- Encofrado losa tercer piso: 100%
- Instalaciones en losa (electroductos, cajas y sanitaria): 100%
- Armaduras losa piso 3 y pasantes sanitarios: 100%
- Hormigonado losa tercer piso (20-09-21): 100%
- Encofrado y carga de pilares para piso 4: 100%
- Hormigonado losa piso 4 de departamentos (25-10-21): 100%
- Hormigonado de pilares para piso 5: 95%
- Previsión de hormigonado piso 5: 12-11-21

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos:



Encofrado para las losa del piso 4



Armaduras, cajas de montantes e instalaciones previas al hormigonado



Colocación de los pasantes sanitarios y cajas de ductos



Escalera para llegar a este piso ya lista a hormigonar



Hormigonado del piso 4 de departamentos



Avance del cargamento



Jornada con el hormigonado del piso 4



Sectores ya terminados



Una vista panorámica del avance del cargamento de la losa del piso 4



Losa del nivel 4 de departamentos ya totalmente hormigonado



Una vista de la logística del cargamento




Pilares para el siguiente nivel –piso 5



Vista panorámica del avance actual de la estructura


PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:

PLANTA BAJA




PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:


ESTACIONAMIENTO 1

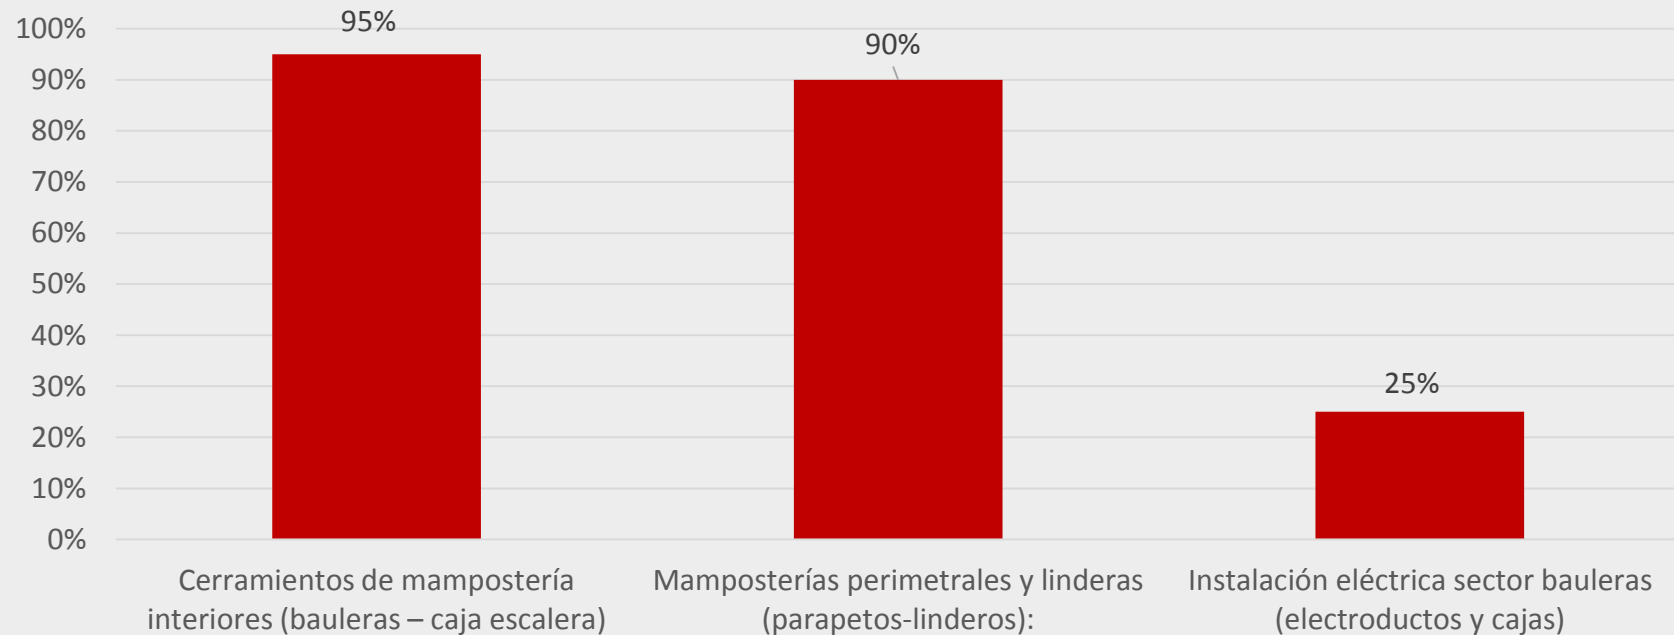

PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:

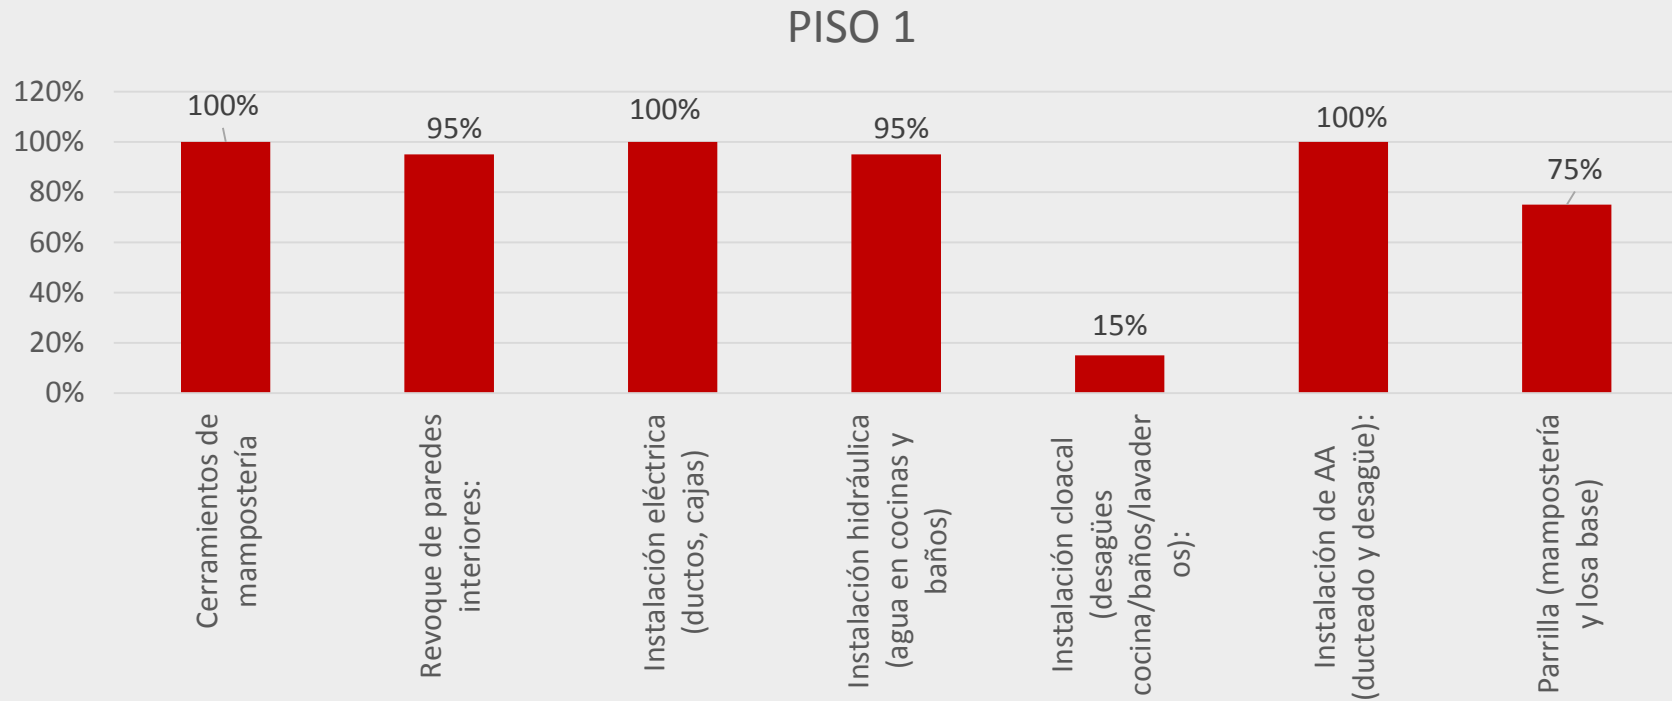

PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:

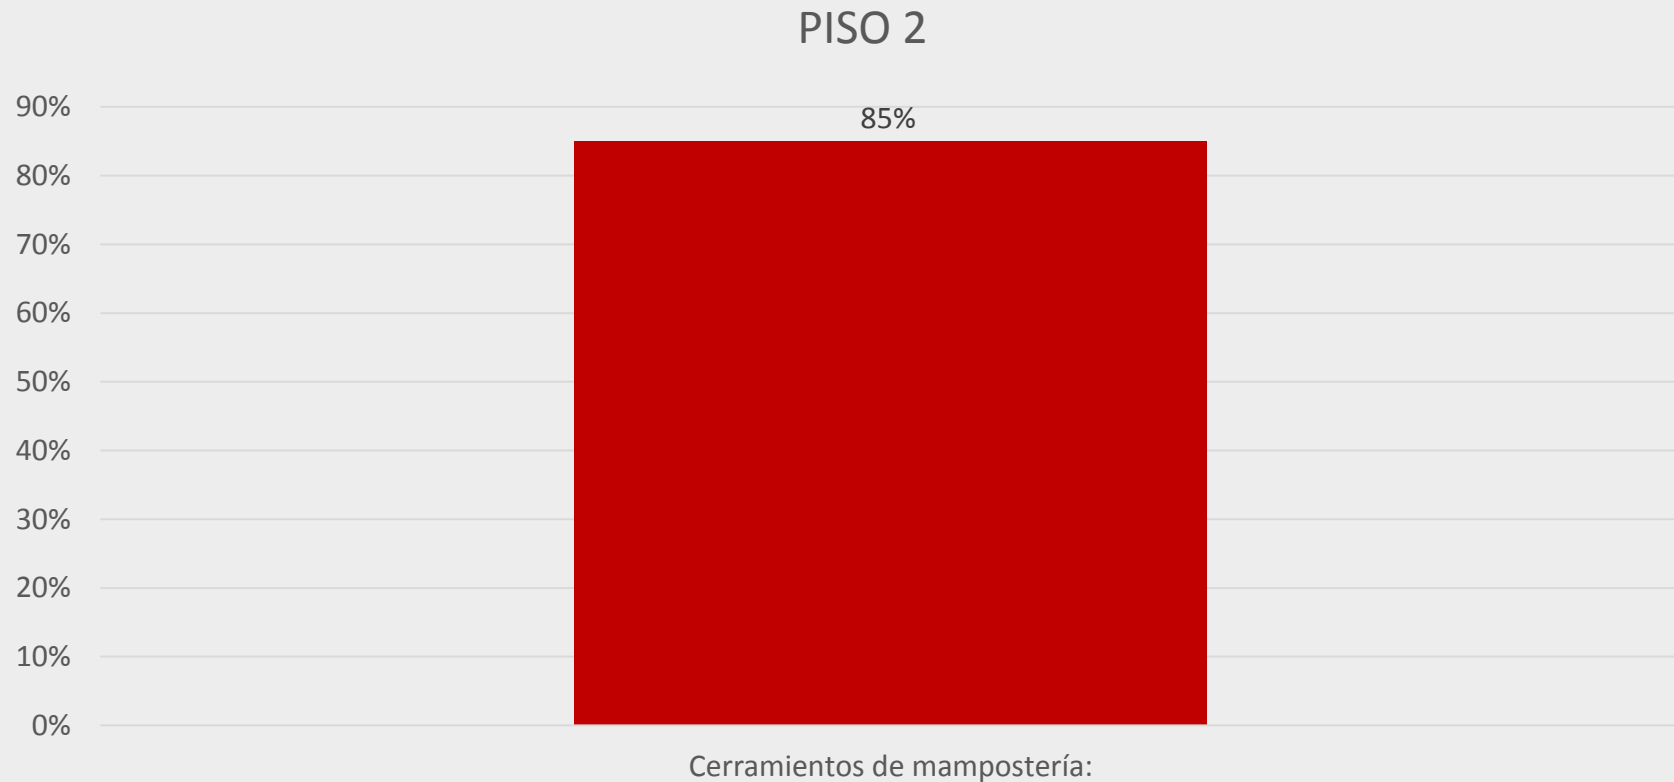

A continuación, algunas tomas fotográficas de los trabajos en este rubro:



Revoques en piso 1



Revoque, instalación hidráulica y electroductos en el 1F



Instalación hidráulica y pasantes cloacales baño del 1D




Ducteado para AA y desague en el 1D



Instalación hidráulica 1B



Avance del cargamento con el cargado del nivel de la losa




Mamposterías en el piso 2



Mampostería de cerramiento en el 2G



Mampostería en el 2D



Vista actual mampostería palier piso 2 de departamentos



Colocación de electroductos en bauleras del E1



Vista actual de la mampostería de las bauleras



Vista actual del avance en acceso a E1



Vista actual desde la Av. Laguna Grande



Vista desde otra perspectiva



Vista de una de sus fachadas laterales



Vista actual fachada posterior



Vista actual fachada principal

Desarrola y Comercializa:

INMO
desarrollos
