

**INMO**  
desarrollos 

---

**LAGUNA CLUB**  
apartments & lofts



# LAGUNA CLUB

apartments & lofts

**AVANCES DE OBRA**

MARZO 2022

# **ESTRUCTURA DE HORMIGON**

- Losa primer piso de departamentos: 100%
- Hormigonado losa segundo piso (22-07-21): 100%
- Pilares losa tercer piso: 100%
- Encofrado losa tercer piso: 100%
- Instalaciones en losa (electroductos, cajas y sanitaria): 100%
- Armaduras losa piso 3 y pasantes sanitarios: 100%
- Hormigonado losa tercer piso (20-09-21): 100%

# ESTRUCTURA DE HORMIGON

- Encofrado y carga de pilares para piso 4: 100%
- Hormigonado losa piso 4 de departamentos (25-10-21): 100%
- Hormigonado de pilares para piso 5: 100%
- Hormigonado losa piso 5 de departamentos (27-11-21): 100%
- Hormigonado losa piso de azotea y tabiques de piscina (29-01-22): 100%
- Armadura y encofrado pilares losa quincho, caja escalera y piscina: 99%
- Encofrado y armaduras tabiques tanque de agua superior: 99%

# **ESTRUCTURA DE HORMIGON**

- Encofrado y armaduras losa techo sobre recorrido ascensor: 100%
- Hormigonado losa techo quincho y losa tapa caja ascensor (05/03/22): 100%
- Tanque de agua inferior: 100%

A continuación, algunas tomas fotográficas de estos trabajos:



Armadura y encofrado pilares para quincho y tabique caja de escalera y ascensor



Encofrado losa techo de quincho



Avance del encofrado de losa quincho, caja de escalera y armaduras tanque superior



Vista panorámica del avance



Armado de vigas de losas y tanque superior de agua



Encofrado losa tapa de ascensor



Encofrado tabiques tanque superior



Una vista general de l avance




Hormigonado de la losa techo del quincho azotea



Losa ya hormigonada


# PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:

## PLANTA BAJA

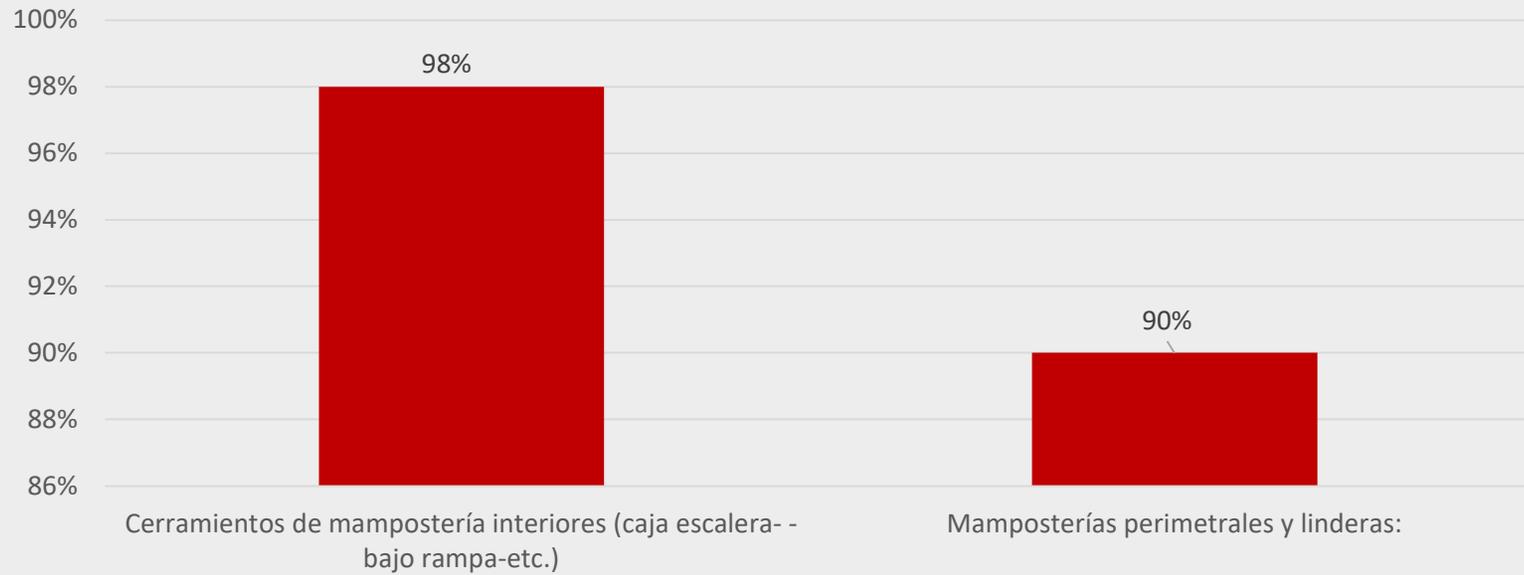


# PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:

## ESTACIONAMIENTO 1

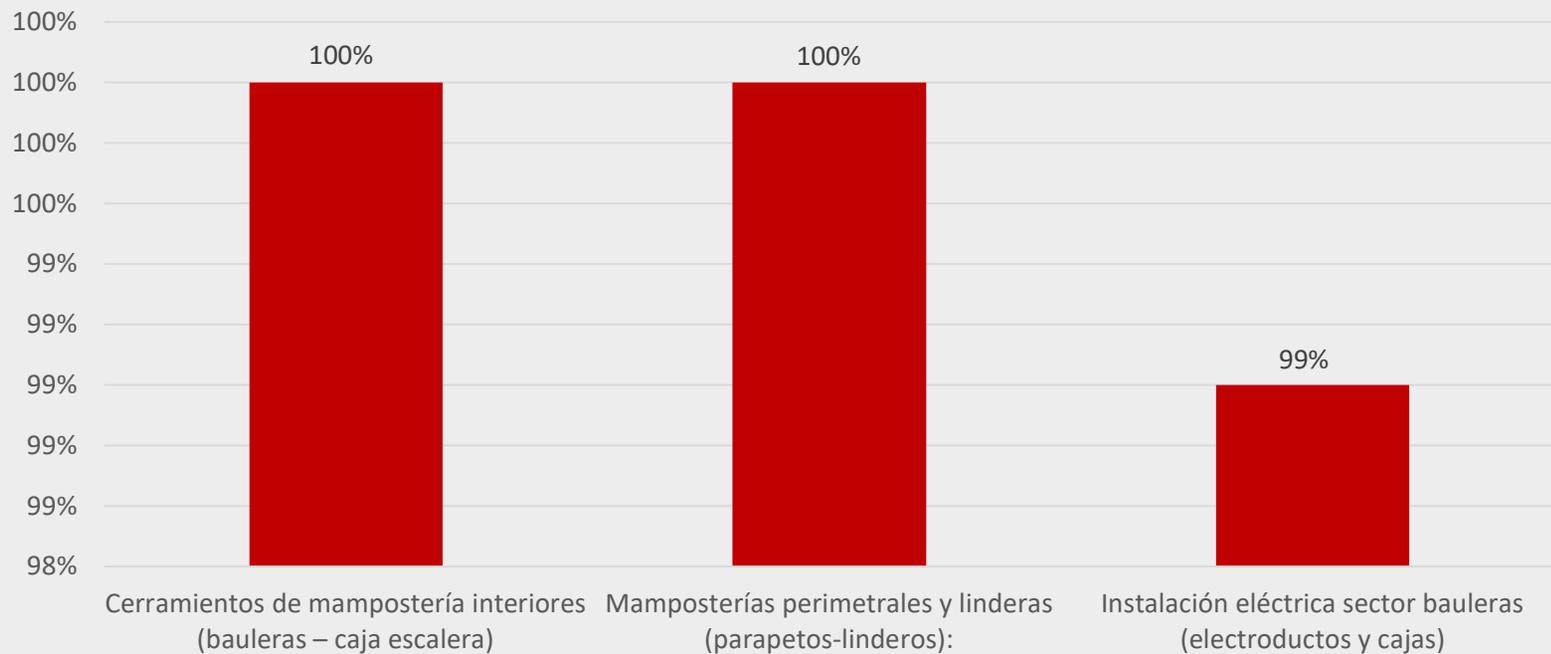

# PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:

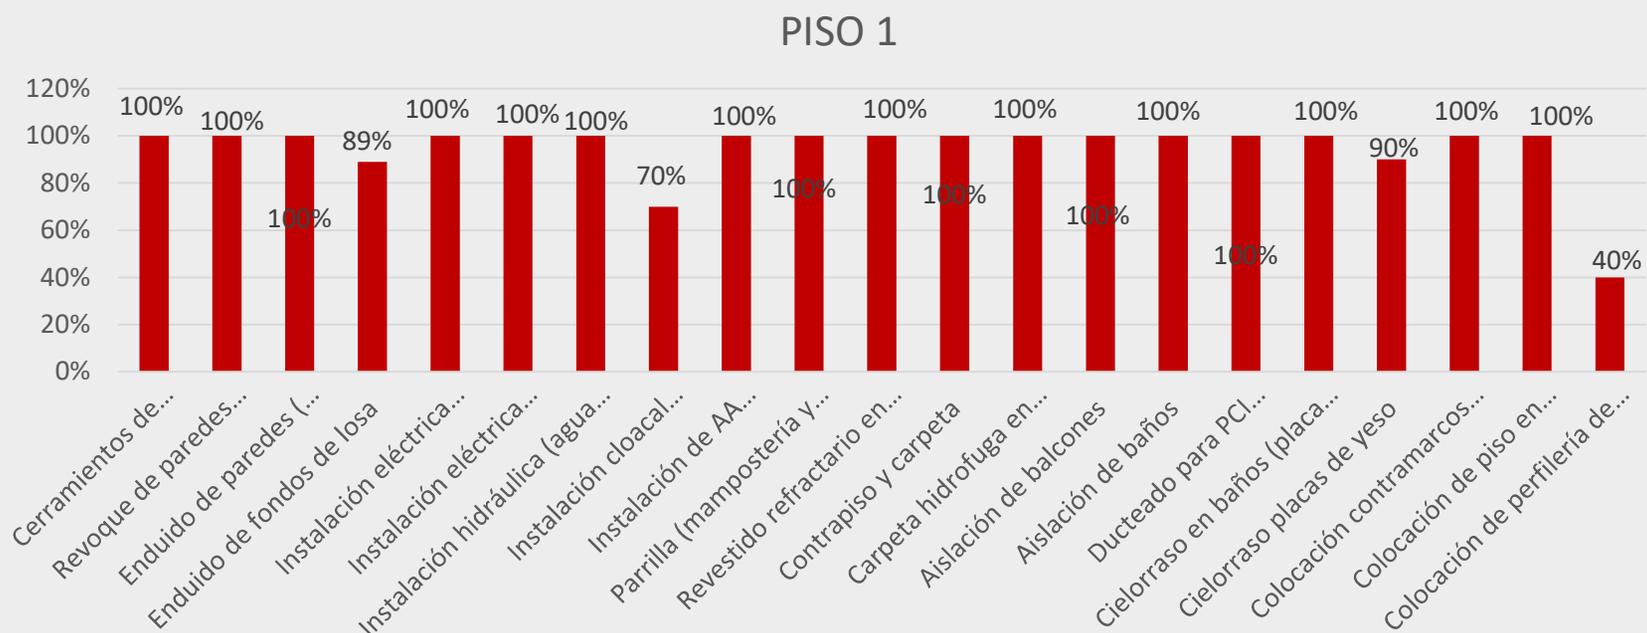

A continuación, algunas tomas fotográficas de los trabajos en rubro de este nivel:



Cielorraso estructurado en el baño del 1A



Cableado de los circuitos en el 1A



Colocación de piso, cableado y Enduido del B



Piso en balcones



Colocación de contramarcos en ventanas piso



Colocación de perfilería de aluminio



Cielorraso en baño del 1C



Piso, enduido de paredes y losa, cableado 1G



Cielorraso de yeso en el 1E



Vista actual 1F




Cielorraso en palier del piso 1



Nicho para lavarropa y desagües en el 1D

## PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:

PISO 2

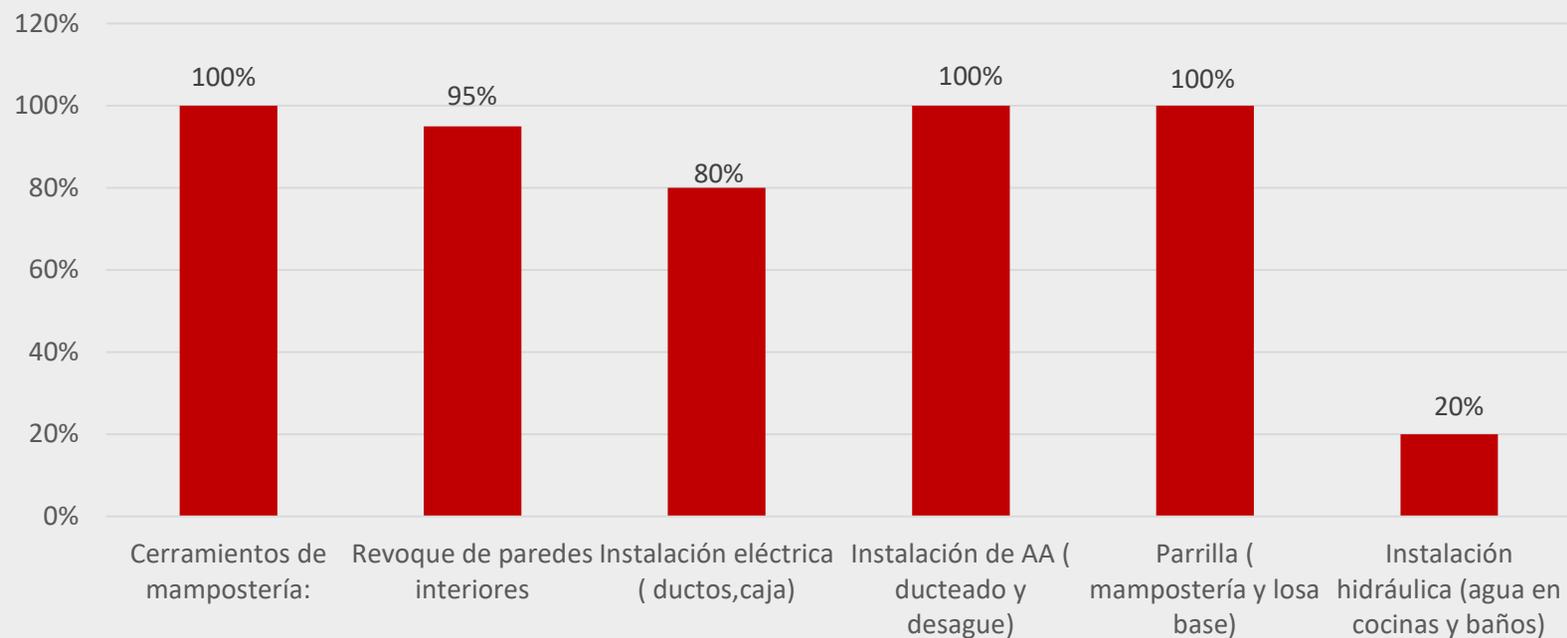

A continuación, algunas tomas fotográficas de los trabajos en rubros de este nivel:



Vista actual palier piso 2



Desagües e inicios de replanteo instalación de agua en baños piso 2



Revoque de paredes en el 2B



Revoque e instalación de electroductos 2D




Ducteado de AA y electroductos bajo losa techo piso 2



Vista actual de los avances en el 2G

## PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:

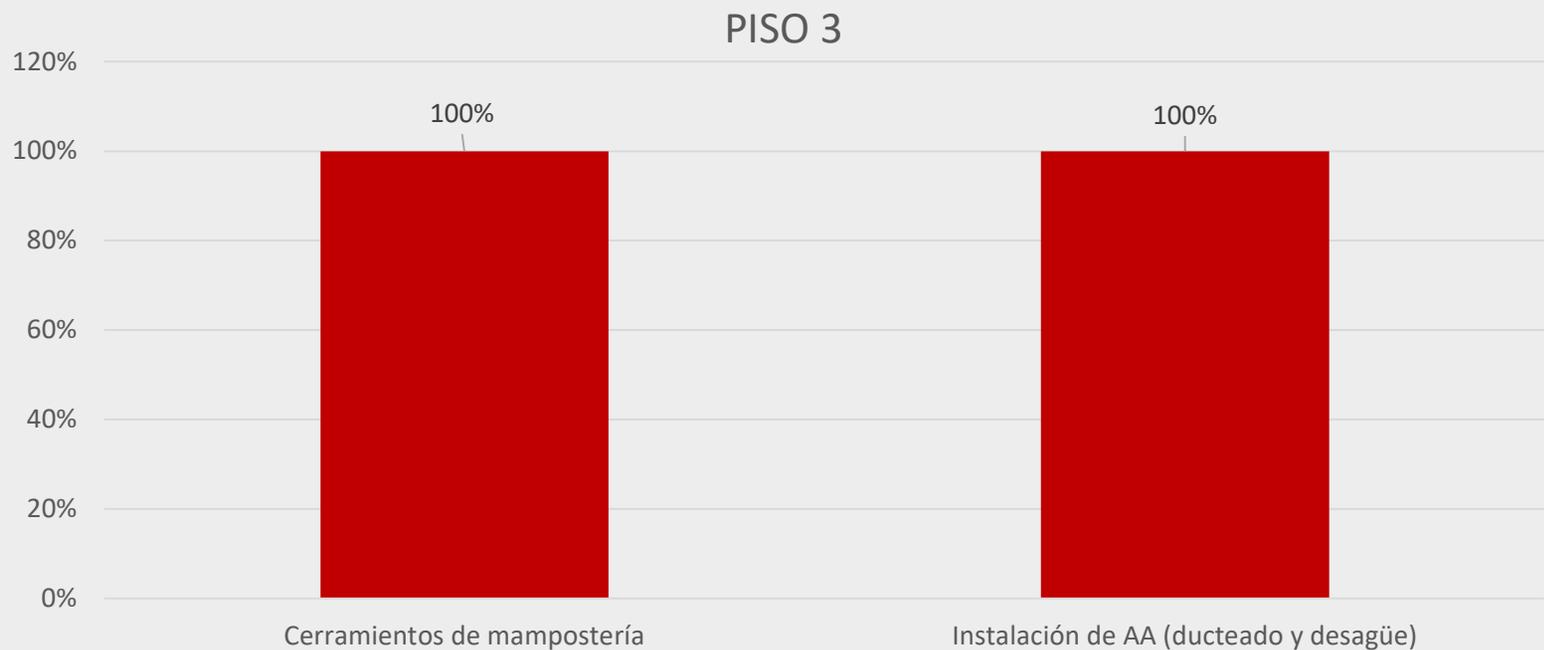

A continuación, algunas tomas fotográficas de los trabajos en rubros de este nivel:



Vista actual palier del piso 3



Mampostería de cerramiento en el 3A



Mampostería en el 3C



Cerramiento en el 3D




Ducteado y desagüe para AA en el 3E



Ductado de las líneas de alimentación de cobre y desagüe para AA piso 3

## **PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:**



A continuación, algunas tomas fotográficas de los trabajos en rubros de este nivel:



Vista actual cerramiento del palier del piso 4



Mampostería en el 4A




Cerramientos en el 4C



Mampostería en el 4G

## PORCENTAJE DE AVANCE POR RUBRO Y NIVELES:



A continuación, algunas tomas fotográficas de los trabajos en este nivel:



Inicio de la mampostería piso 5



Cerramiento de mampostería en el piso 5



Mampostería de parapetos en linderos piso 5



Una vista actual del avance



Vista actual desde otra perspectiva



Fachada principal

Desarrola y Comercializa:



 +595 981 442 600 / +595 986 600 850

 [ventas@inmo.com.py](mailto:ventas@inmo.com.py)

 [www.inmo.com.py](http://www.inmo.com.py)

  @inmodesarrollos
